


16-01-07_Harmonogram_CPTO_V9_VZ_TDI

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí			1. čtvrtletí			1. čtvrtletí			1. čtvrtletí					
					XI	IV	IX	II	VII	XII	V	X	III	VIII	I	VI			
1	Výběr projektanta	204 dny	10.12. 14	22.9. 15															
2	Souhlas MŠMT Souhlas MŠMT se SoN	1 den	10.12. 14	10.12. 14															
3	Zahájení SoN	0 dny	16.2. 15	16.2. 15															
4	Lhůta pro podání soutěž. návrhů SoN	51 upl.dny	16.2. 15	8.4. 15															
5	1. Zasedání poroty SoN	16 upl.dny	8.4. 15	24.4. 15															
6	Hodnocení 1.kolo SoN	10 upl.dny	25.4. 15	5.5. 15															
7	Oznámení výsledků 1.kola + stanovení doplňujících podmínek pro 2.kolo	1 upl.den	5.5. 15	6.5. 15															
8	Odeslání výzvy pro podání návrhů do 2.kola	1 upl.den	7.5. 15	8.5. 15															
9	Lhůta pro podání návrhů do 2.kola	38 upl.dny	8.5. 15	15.6. 15															
10	Hodnocení výsledků 2.kola	2 upl.dny	8.7. 15	10.7. 15															
11	Doporučení poroty - výsledek SoN	1 upl.den	10.7. 15	11.7. 15															
12	Rozhodnutí vyhlášovatele SoN	7 upl.dny	11.7. 15	18.7. 15															
13	Vyplácení cen SoN	1 upl.den	22.8. 15	23.8. 15															
14	Prezentace všech soutěžních návrhů	29 upl.dny	23.8. 15	21.9. 15															
15	Zpracování zadávací dokumentace JŘBU	60 upl.dny	15.4. 15	14.6. 15															
16	Schválení zadávací dokumentace na MŠMT	30 upl.dny	14.6. 15	14.7. 15															
17	Zaslání podmínek vítězi SoN	6 upl.dny	18.7. 15	24.7. 15															
18	Vyjednávání v JŘBU	30 upl.dny	24.7. 15	23.8. 15															
19	Schválení smlouvy na s vítězem SoN na MŠMT	30 upl.dny	23.8. 15	22.9. 15															
20	Výběr zhotovitele	261 dny	22.9. 15	21.9. 16															
21	Podpis SoD s vítězem JŘBU na vypracování PD	0 dny	22.9. 15	22.9. 15															
22	Dopracování návrhu Stavby	60 upl.dny	22.9. 15	21.11. 15															
23	Schválení návrhu Stavby UJEP	20 upl.dny	21.11. 15	11.12. 15															
24	Dopracování dokumentace pro územní řízení (DÚR)	220 upl.dny	22.9. 15	29.4. 16															

Pozn. Termíny uvedené v harmonogramu jsou stanoveny jako orientační a nejsou závazné vzhledem k uplatnění nároku k vyplacení odměny příkazníka.

16-01-07_Harmonogram_CPTO_V9_VZ_TDI

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	1. čtvrtletí		1. čtvrtletí		1. čtvrtletí			1. čtvrtletí		1. čtvrtletí		
					XI	IV	IX	II	VII	XII	V	X	III	VIII	I	VI
25	Schválení DÚR UJEP	20 upl.dny	29.4. 16	19.5. 16												
26	Pravomocné rozhodnutí o změně ÚR	220 upl.dny	22.9. 15	29.4. 16												
27	Vypracování PD pro vydání stavebního povolení (DSP)	300 upl.dny	22.9. 15	18.7. 16												
28	Schválení DSP UJEP	20 upl.dny	18.7. 16	7.8. 16												
29	Vydání pravomocného SP	300 upl.dny	22.9. 15	18.7. 16												
30	Vypracování PD pro provádění stavby (DPS) + projekt Interiéru	365 upl.dny	22.9. 15	21.9. 16												
31	Schválení DPS	365 upl.dny	22.9. 15	21.9. 16												
32	Komise expertů (KE) - předložení a příprava schválení IZ + PD	43 upl.dny	29.4. 16	11.6. 16												
33	Schválení KE Schválení dokumentů v komisi expertů	14 upl.dny	11.6. 16	25.6. 16												
34	Příprava nového IZ na stavbu	60 upl.dny	29.4. 16	28.6. 16												
35	Předložení IZ na stavbu na MŠMT ke schválení	30 upl.dny	28.6. 16	28.7. 16												
36	Realizace stavby	718 dny	24.5. 16	22.2. 19												
37	Předběžné oznámení VZ pro výběr zhotovitele	30 upl.dny	17.8. 16	16.9. 16												
38	Zadávací dokumentace pro VZ na zhotovitele stavby	116 upl.dny	24.5. 16	17.9. 16												
39	Schválení VZ na MŠMT	30 upl.dny	17.9. 16	17.10. 16												
40	VZ na zhotovitele stavby	152 upl.dny	17.10. 16	18.3. 17												
41	Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky	1 upl.den	18.3. 17	19.3. 17												
42	Kontrola MŠMT - SOD před podpisem	30 upl.dny	18.3. 17	17.4. 17												
43	Podpis SoD se zhotovitelem	5 upl.dny	17.4. 17	22.4. 17												
44	Realizace stavby	630 upl.dny	27.4. 17	17.1. 19												
45	Předběžné oznámení VZ pro výběr dodavatele interiéru stavby	30,38 upl.dny	17.12. 17	16.1. 18												
46	Zadávací dokumentace pro VZ na dodavatele interiéru stavby	116 upl.dny	17.1. 18	13.5. 18												

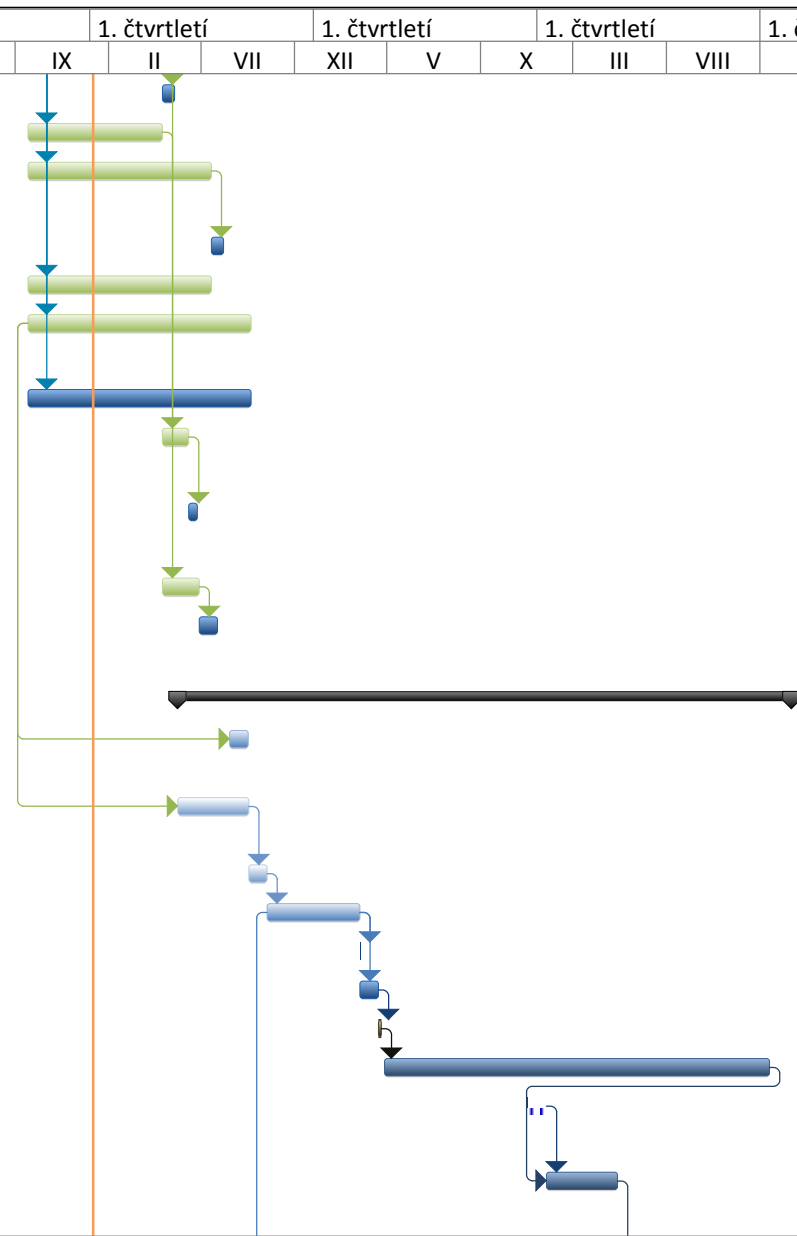

16-01-07_Harmonogram_CPTO_V9_VZ_TDI

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí		1. čtvrtletí		1. čtvrtletí			1. čtvrtletí		1. čtvrtletí		
					XI	IV	IX	II	VII	XII	V	X	III	VIII	I	VI
47	Schválení VZ na MŠMT	30 upl.dny	18.5. 18	17.6. 18												
48	VZ na dodávku interiéru	90 upl.dny	17.6. 18	15.9. 18												
49	Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky	1 upl.den	15.9. 18	16.9. 18												
50	Kontrola MŠMT - SOD před podpisem	30 upl.dny	16.9. 18	16.10. 18												
51	Podpis SoD se zhotovitelem	5 upl.dny	18.10. 18	23.10. 18												
52	Dodávka interiéru	122 upl.dny	23.10. 18	22.2. 19												
53	Vydání kolaudačního souhlasu	120 upl.dny	22.2. 19	22.6. 19												
54	Vypořádání dotace + předání dokumentace na MŠMT	110 upl.dny	22.6. 19	10.10. 19												
55	TDI	2341 dny	30.10. 15	19.10. 24												
56	Zadávací dokumentace pro VZ na TDI	81 upl.dny	30.10. 15	19.1. 16												
57	VZ na TDI stavby	60 upl.dny	19.1. 16	19.3. 16												
58	Činnost TDI do doby dokončení výstavby a vydání kolaudačního souhlasu	1100 upl.dny	17.6. 16	22.6. 19												
59	Činnost TDI stavby při odstraňování vad v záruce	1946 upl.dny	22.6. 19	19.10. 24												
60	BOZP	564 dny	16.2. 17	17.4. 19												
61	Zadávací dokumentace pro VZ na koordinátora BOZP	40 upl.dny	16.2. 17	28.3. 17												
62	VZ na BOZP stavby	30 upl.dny	28.3. 17	27.4. 17												
63	Činnost BOZP do doby dokončení výstavby a vydání kolaudačního souhlasu	720 upl.dny	27.4. 17	17.4. 19												

